

Ведомость объемов выполненных работ по объекту:
«Благоустройство дворовой территории жилого дома №3, №25 ул.Ленина, жилого дома №4, №13 ул.Школьная, жилого дома №14 ул.Пушкина в пгт.Хотынец Хотынецкого района Орловской области»

№ п/ п	Наименование работ	Ед. изм.	Объемы работ		Сметная цена за единицу, руб.	Сметная стоимость фактически выполненног о объема работ, тыс.руб.
			По проектно -сметной документ ации	Фактическ и выполнено		
ул. Ленина д.3						
1	Разработка грунта с погрузкой на автомоби-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 51*0,3	1000 м3	0.0153	0.0153	4540.85	69
2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км I класс груза (15,3*1,75=26,775)	1 т груза	26.775	26.775	6.84	183
3	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев из песка (51*0,2)	100 м3	0.102	0.102	2349.28	240
4	Песок природный для строительных работ средний(10,2*1,1=11,22м3)	м3	11.22	11.22	50.24	564
5	Исправление профиля оснований: щебеночных с добавлением нового материала	1000 м2	0.135	0.135	16705.29	2255
6	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 5(3)-10 мм	м3	-1.553	-1.553	156.9	-244
7	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 5(3)-10 мм	м3	1.553	1.553	146.7	228
8	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 10-20 мм	м3	-7,425	-7,425	147.8	-1097
9	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 10-20 мм (135*0,024*1,26)	м3	4.08	4.08	120	490
10	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2): однослойных	1000 м2	0.186	0.186	24975.88	4646
11	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 160 км I класс груза (37,94+1,553+4,08)*1,3	1 т груза	56.57	56.57	72	4073
12	Розлив вяжущих материалов (0,08т/100м2*186м2)	1 т	0.1488	0.1488	1578.55	235
13	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ	т	-0,1533	-0,1533	1496.52	-229
14	Эмульсия битумно-катионная, марка ЭБК-1	т	0.1533	0.1533	1923.08	295
15	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2	0.186	0.186	46597.63	8667
16	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка П, тип А	т	-17,97	-17,97	452.6	-8133
17	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка П, тип В	т	17.97	17.97	480	8626
18	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 *2	1000 м2	0.186	0.186	10965.38	2040
19	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и	т	-4,501	-4,501	452.6	-2037

	асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка П, тип А					
20	Асфальтобетонные-смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка П, тип В	т	4.501	4.501	480	2160
	Обочины					
21	Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см	1000 м2	0.0185	0.0185	2841.73	53
22	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм	м3	2.331	2.331	110	256
23	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 160 км I класс груза	1 т груза	3.03	3.03	72	218
	Скамейки, урны, светильники					
24	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0.0026	0.0026	2203.6	6
25	Устройство фундаментов-столбов: бетонных	100 м3	0.0026	0.0026	69206.78	180
26	Монтаж: стеллажей и других конструкций, закрепляемых на фундаментах внутри зданий (монтаж скамеек и урн)(22*2+9*2=62кг)	1 т	0.062	0.062	1050.26	65
27	Скамья бульварная со спинкой и без подлокотников БС-4	шт.	2	2	890.38	1781
28	Урна металлическая опрокидывающаяся	шт.	2	2	524.2	1048
29	Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами: люминесцентными	1 шт.	2	2	162.26	325
30	Светильник алюм спл. (ЛН_Е27) 60Вт пылевл-защ. IP54 овал./решётка/чёрн. ИЭК 311/6,71/1,2	шт	2	2	38.62	77
31	Лампа энергосберегающая TOSHIBA 30W/3U E27	шт.	2	2	28.71	57
ул.Ленина д.25						
1	участок 290м2+36м2=326м2 (в.ч.12м2 тротуар)					
2	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов (94*0,3)	1000 м3	0.0282	0.0282	4540.85	128
3	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км I класс груза (28,2*1,75)	1 т	49.35	49.35	6.84	338
4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев из песка (94*0,2)	100 м3	0.188	0.188	2349.28	442
5	Песок природный для строительных работ средний(18,8*1,1=20,68м3)	м3	20.68	20.68	50.24	1039
6	Исправление профиля оснований: щебеночных с добавлением нового материала	1000 м2	0.22	0.22	16705.29	3675
7	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 5(3)-10 мм	м3	-2.53	-2.53	156.9	-397
8	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 5(3)-10 мм	м3	2.53	2.53	146.7	371
9	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 10-20 мм	м3	-12,1	-12,1	147.8	-1788
10	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 10-20 мм (220*0,038*1,26)	м3	10.53	10.53	120	1264
11	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2): однослойных	1000 м2	0.314	0.314	24975.88	7842
12	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 160 км I класс груза	1 т груза	100.18	100.18	72	7213
13	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных (тротуар 12м2*0,05)	100 м3	0.006	0.006	5683.35	34
14	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т	1.44	1.44	3.47	5

	(0,6м3*2,4т/м3=1,44т)					
15	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км I класс груза	1 т	1.44	1.44	6.84	10
16	Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: до 18 см	1 колодец	2	2	163.49	327
17	Розлив вяжущих материалов (0,08т/100м2*326м2)	1 т	0.2608	0.2608	1578.55	412
18	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ	т	-0.2686	-0.2686	1496.52	-402
19	Эмульсия битумно-катионная, марка ЭБК-1	т	0.2686	0.2686	1923.08	517
20	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2	0.326	0.326	46597.63	15191
21	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка П, тип А	т	-31.49	-31.49	452.6	-14252
22	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка П, тип В	т	31.49	31.49	480	15115
23	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01	1000 м2	0.326	0.326	10965.38	3575
24	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка П, тип А	т	-7.889	-7.889	452.6	-3571
25	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка П, тип В	т	7.889	7.889	480	3787
	Бордюры					
26	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1 (для устройства бордюров БР 100.30.15) (50*0,35*0,2)	100 м3	0.035	0.035	928.66	33
27	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1 (разравнивание грунта)	1000 м3	0.0035	0.0035	456.6	2
28	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка(50*0,35*0,03)	100 м3	0.00525	0.00525	2349.28	12
29	Песок природный для строительных работ средний	м3	0.5775	0.5775	50.24	29
30	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (50*0,35*0,03)	100 м3	0.00525	0.00525	3694.99	19
31	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 5(3)-10 мм (0,525*1,26)	м3	0.6615	0.6615	146.7	97
32	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 160 км I класс груза (0,6615*1,3)	1 т	0.851	0.851	72	61
33	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м	0.5	0.5	4507.82	2254
34	Камни бортовые БВ 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,042 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	50	50	72.36	3618
	Скамейки, урны, светильники					
35	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2	100 м3	0.0026	0.0026	2203.6	6
36	Устройство фундаментов-столбов: бетонных	100 м3	0.0026	0.0026	69206.78	180
37	Монтаж: стеллажей и других конструкций, закрепляемых на фундаментах внутри зданий (монтаж скамеек и урн)(22*3+9*2=84кг)	1 т	0.084	0.084	1050.26	88
38	Скамья бульварная со спинкой и без подлокотников БС-4	шт.	3	3	890.38	2671
39	Урна металлическая опрокидывающаяся	шт.	2	2	524.2	524.2

40	Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами: люминесцентными	1 шт.	2	2	162.26	325
41	Светильник алюм спл. (ЛН Е27) 60Вт пылевл-защ. IP54 овал./решётка/чёрн. ИЭК 311/6,71/1,2	шт	2	2	38.62	77
42	Лампа энергосберегающая TOSHIBA 30W/3U E27	шт	2	2	28.71	57
ул. Школьная д.4						
1	Исправление профиля оснований: щебеночных с добавлением нового материала (461-80=381м2)	1000 м2	0.381	0.381	16705.29	6365
2	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 10-20 мм	м3	-20,96	-20,96	147.8	-3098
3	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 5(3)-10 мм	м3	-4,382	-4,382	156.9	-688
4	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 10-20 мм	м3	20.96	20.96	120	2515
5	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 5(3)-10 мм	м3	4.382	4.382	146.7	643
6	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2): однослойных	1000 м2	0.381	0.381	24975.88	9516
7	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 40-70 мм	м3	-72,01	-72,01	101	-7273
8	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм	м3	72.01	72.01	110	7921
9	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-007-01, 27-04-007-02, 27-04-007-03 (ОЗП=7; ЭМ=7; ЗПМ=7; МАТ=7 к расх.)	1000 м2	-0.381	-0.381	10475.15	-3991
10	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 40-70 мм	м3	33,6	33,6	101	3394
11	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм	м3	-33.6	-33.6	110	-3696
12	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 160 км I класс груза (20,96+4,382+5,715(72,01-33,6)+5,04+1,323*1,3)	1 т груза	98.3	98.3	72	7078
13	Розлив вяжущих материалов (0,08т/100м2*461м2)	1 т	0.3688	0.3688	1578.55	582
14	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ	т	-0.3799	-0.3799	1496.52	-569
15	Эмульсия битумно-катионная, марка ЭБК-1	т	0.3799	0.3799	1923.08	731
16	Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: до 18 см	1 колодец	4	4	163.49	654
17	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2	0.461	0.461	46597.63	21482
18	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип А	т	-44.53	-44.53	452.6	-20154
19	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип В	т	44.53	44.53	480	21374
20	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 (ОЗП=2; ЭМ=2; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.)	1000 м2	0.461	0.461	10965.38	5055
21	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип А	т	-11.16	-11.16	452.6	-5051
22	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип В	т	11.16	11.16	480	5357

	Добавить работы					
23	участок 40м2 (выравнивающий слой по плитам)					
24	Розлив вяжущих материалов (0,08т/100м2*40+15м2)	1 т	0.044	0.044	1578.55	69
25	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ	т	-0.0453	-0.0453	1496.52	-68
26	Эмульсия битумно-катионная, марка ЭБК-1	т	0.0453	0.0453	1923.08	87
27	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (40*0,10)	100 м3	0.04	0.04	3694.99	148
28	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 5(3)-10 мм (4*1,26)	м3	5.04	5.04	146.7	739
29	участок с асфальтированием 15м2					
30	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (15*0,07)	100 м3	0.0105	0.0105	3694.99	39
31	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 5(3)-10 мм (1,5*1,26)	м3	1.323	1.323	146.7	194
32	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2	0.015	0.015	46597.63	699
33	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка П, тип А	т	-1.449	-1.449	452.6	-656
34	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка П, тип В	т	1.449	1.449	480	696
35	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 (ОЗП=2; ЭМ=2; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.)	1000 м2	0.015	0.015	10965.38	164
36	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка П, тип А	т	-0.363	-0.363	452.6	-164
37	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка П, тип В	т	0.363	0.363	480	174
	Бордюры					
38	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1 (для устройства бордюров БР 100.30.15) (48*0,3*0,2)	100 м3	0.0288	0.0288	928.66	27
39	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1 (разравнивание грунта)	1000 м3	0.00288	0.00288	456.6	1
40	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка(48*0,3*0,03)	100 м3	0.00432	0.00432	2349.28	10
41	Песок природный для строительных работ средний	м3	0.4752	0.4752	50.24	24
42	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (48*0,3*0,03)	100 м3	0.00432	0.00432	3694.99	16
43	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 5(3)-10 мм (0,432*1,26)	м3	0.544	0.544	146.7	80
44	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 160 км I класс груза (0,544*1,3)	1 т	0.708	0.708	72	51
45	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м	0.48	0.48	4507.82	2164
46	Камни бортовые БВ 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,042 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	48	48	72.36	3473
	Скамейки, урны, светильники					
47	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2	100 м3	0.0026	0.0026	2203.6	6

48	Устройство фундаментов-столбов: бетонных	100 м3	0.0026	0.0026	69206.78	180
49	Монтаж: стеллажей и других конструкций, закрепляемых на фундаментах внутри зданий (монтаж скамеек и урн)(22*2+9*2=62кг)	1 т	0.062	0.062	1050.26	65
50	Скамья бульварная со спинкой и без подлокотников БС-4	шт.	2	2	890.38	1781
51	Урна металлическая опрокидывающаяся	шт.	2	2	524.2	1048
52	Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами: люминесцентными	1 шт.	2	2	162.26	325
53	Светильник алюм спл. (ЛН Е27) 60Вт пылевл-защ. IP54 овал./решётка/чёрн. ИЭК 311/6,71/1,2	шт	2	2	38.62	77
54	Лампа энергосберегающая TOSHIBA 30W/3U E27	шт	2	2	28.71	57
	Обочины					
55	Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см	1000 м2	0.032	0.032	2841.73	91
56	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм	м3	4.032	4.032	110	444
57	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 160 км I класс груза	1 т груза	5.242	5.242	72	377
ул.Школьная д.13						
3	Розлив вяжущих материалов (0,08т/100м2*637м2)	1 т	0.5096	0.5096	1578.55	804
4	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ	т	-0.5249	-0.5249	1496.52	-786
5	Эмульсия битумно-катионная, марка ЭБК-1	т	0.5249	0.5249	1923.08	1009
6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2	0.637	0.637	46597.63	29683
7	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип А	т	-61.53	-61.53	452.6	-27848
8	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип В	т	61.53	61.53	480	29534
9	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 (ОЗП=2; ЭМ=2; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.)	1000 м2	0.637	0.637	10965.38	6985
10	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип А	т	-15,42	-15,42	452.6	-6979
11	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип В	т	15.42	15.42	480	7402
	Бордюры					
12	Разборка бортовых камней: на щебеночном основании	100 м	1.17	1.17	991.57	1160
13	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1 (для восстановления бордюров БР 100.30.15) (0,2*0,1*117)	100 м3	0.0234	0.0234	928.66	22
14	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов I (разравнивание грунта)	1000 м3	0.00234	0.00234	456.6	1
15	Разборка покрытий и оснований: щебеночных (под установку бордюров 117*0,15*0,1)	100 м3	0.01755	0.01755	566.07	10
16	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т	10.9509	10.9509	3.47	38
17	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км I класс груза (бордюры	1 т	10.9509	10.9509	6.84	75

	117*0,016*1,8=3,3696т; 1,755*2,4= 4,212т)					
18	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка(117*0,3*0,03)	100 м3	0.01053	0.01053	2349.28	25
19	Песок природный для строительных работ средний (1,053*1,1)	м3	1.1583	1.1583	50.24	58
20	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (117*0,3*0,03)	100 м3	0.01053	0.01053	3694.99	39
21	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 5(3)-10 мм (1,053*1,26)	м3	1.327	1.327	146.7	195
22	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 160 км I класс груза (1,327*1,3)	1 т	1.7251	1.7251	72	124
23	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м	1.17	1.17	4507.82	5274
24	Камни бортовые БВ 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,042 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	117	117	72.36	8466
	Скамейки, урны, светильники					
25	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2	100 м3	0.0038	0.0038	2203.6	8
26	Устройство фундаментов-столбов: бетонных	100 м3	0.0038	0.0038	69206.78	263
27	Монтаж: стеллажей и других конструкций, закрепляемых на фундаментах внутри зданий (22*3+9*3=93кг)	1 т	0.093	0.093	1050.26	98
28	Скамья бульварная со спинкой и без подлокотников БС-4	шт.	3	3	890.38	2671
29	Урна металлическая опрокидывающаяся	шт.	3	3	524.2	1573
30	светильники на фасаде здания					
31	Демонтаж кабеля	100 м	0.24	0.24	76.18	18
32	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп	100 шт.	0.03	0.03	147.05	4
33	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм	100 м	0.24	0.24	235.2	56
34	Кабель-канал (короб) "Электропласт" 25х16 мм	м	24	24	1.71	41
35	Провод в коробах, сечением: до 6 мм2	100 м	0.24	0.24	41.51	10
36	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 1,5 мм2	1000 м	0.024	0.024	3265.97	78
37	Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29 1Р 16А, характеристика С	шт.	3	3	9.87	30
38	Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами: люминесцентными	1 шт.	3	3	162.26	487
39	Светильник алюм спл. (ЛН Е27) 60Вт пылевл-защ. IP54 овал./решётка/чёрн. ИЭК 311/6,71/1,2	шт	3	3	38.62	116
40	Лампа энергосберегающая TOSHIBA 30W/3U E27	шт	3	3	28.71	86
41	Смена: выключателей	100 шт.	0.03	0.03	842.52	25
	Обочины*					
42	Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см	1000 м2	0.058	0.058	2841.73	165
43	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм	м3	7.308	7.308	110	804
44	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 160 км I класс груза	1 т	9.5004	9.5004	72	684
45	Добавить участок 6,0*4,8=28,8м2					
46	Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной: 80 мм площадью ремонта до 5 м2	100 м2	0.0651	0.0651	11358.01	739
47	Розлив вяжущих материалов(0,08т/100м2*28,8м2)	1 т	0.02304	0.02304	1578.55	36
48	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ	т	-0.0237	-0.0237	1496.52	-35
49	Эмульсия битумно-катионная, марка ЭБК-1	т	0.0237	0.0237	1923.08	46
50	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9	1000 м2	0.0288	0.0288	46597.63	1342

	т/м3					
51	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка П, тип А	т	-2.782	-2.782	452.6	-1259
52	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка П, тип В	т	2.782	2.782	480	1335
53	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 (ОЗП=2; ЭМ=2; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.)	1000 м2	0.0288	0.0288	10965.38	316
54	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка П, тип А	т	-0.697	-0.697	452.6	-315
55	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка П, тип В	т	0.697	0.697	480	335
ул. Пушкина д.14						
1	участок $431\text{м}^2 + 36,3 + \text{рад} 4\text{м}^2 = 471,3\text{м}^2$ (в т.ч. тротуар 11м^2)					
2	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: $0, (130\text{м}^2 * 0,3 = 39\text{м}^3)$	1000 м3	0.039	0.039	4540.85	177
3	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км I класс груза $(39 * 1,75 = 68,25\text{т})$	1 т	68.25	68.25	6.84	467
4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев из песка $(130 * 0,2)$	100 м3	0.26	0.26	2349.28	611
5	Песок природный для строительных работ средний $(26 * 1,1 = 28,6\text{м}^3)$	м3	28.6	28.6	50.24	1437
6	Исправление профиля оснований: щебеночных с добавлением нового материала	1000 м2	0.3303	0.3303	16705.29	5518
7	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 5(3)-10 мм	м3	-3.798	-3.798	156.9	-596
8	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 5(3)-10 мм	м3	3.798	3.798	146.7	557
9	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 10-20 мм	м3	-18,17	-18,17	147.8	-2686
10	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 10-20 мм $(330,3 * 0,038 * 1,26)$	м3	15.81	15.81	120	1897
11	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2): однослойных	1000 м2	0.4603	0.4603	24975.88	11496
12	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 160 км I класс груза $(6,905 + 87 + 3,798 + 15,81) * 1,3$	1 т	147.548	147.548	72	10623
13	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных (тротуар $11\text{м}^2 * 0,05$)	100 м3	0.0055	0.0055	5683.35	31
14	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 $(0,55\text{м}^3 * 2,4\text{т/м}^3 = 1,32\text{т})$	1 т	1.32	1.32	3.47	5
15	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км I класс груза	1 т	1.32	1.32	6.84	9
16	Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: до 18 см	1 колодец	2	2	163.49	327
17	Розлив вяжущих материалов $(0,08\text{т/}100\text{м}^2 * 471,3\text{м}^2)$	1 т	0.37704	0.37704	1578.55	595

18	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ	т	-0,3884	-0,3884	1496.52	-581
19	Эмульсия битумно-катионная, марка ЭБК-1	т	0.3884	0.3884	1923.08	747
20	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2	0.4713	0.4713	46597.63	21961
21	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка П, тип А	т	-45.53	-45.53	452.6	-20607
22	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка П, тип В	т	45.53	45.53	480	21854
23	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 (ОЗП=2; ЭМ=2; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.)	1000 м2	0.4713	0.4713	10965.38	5168
24	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка П, тип А	т	-11.41	-11.41	452.6	-5164
25	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка П, тип В	т	11.41	11.41	480	5477
Обочины						
26	Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см (19м*0,5м)+(4,6*0,5*2)+(39,5*0,2)	1000 м2	0.022	0.022	2841.73	63
27	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм	м3	2.772	2.772	110	305
28	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 160 км I класс груза	1 т	3.6036	3.6036	72	259
Скамейки, урны, светильники						
29	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2	100 м3	0.0026	0.0026	2203.6	6
30	Устройство фундаментов-столбов: бетонных	100 м3	0.0026	0.0026	69206.78	180
31	Монтаж: стеллажей и других конструкций, закрепляемых на фундаментах внутри зданий (22*2+9*2=62кг)	1 т	0.062	0.062	1050.26	1050.26
32	Скамья бульварная со спинкой и без подлокотников БС-4	шт.	2	2	890.38	1781
33	Урна металлическая опрокидывающаяся	шт.	2	2	524.2	1048
34	Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами: люминесцентными	1 шт.	2	2	162.26	325
35	Светильник алюм спл. (ЛН_Е27) 60Вт пылевл-защ. IP54 овал./решётка/чёрн. ИЭК 311/6,71/1,2	шт	2	2	38.62	77
36	Лампа энергосберегающая TOSHIBA 30W/3U E27	шт.	2	2	28.71	57

ЗАКАЗЧИК

ОТДЕЛ
ПОСЕЛКОВОЙ
РАБОТЫ
АДМИНИСТРАЦИИ
ХОТЕНСКОГО
РАЙОНА
ОРЛОВСКОЙ
ОБЛАСТИ

М.П. Мирзоев

ПОДРЯДЧИК

ХОТЕНСКОЕ
ОБЩЕСТВО
С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ХВАСОВИЧ-
СКАЯ
ПМК-9

М.П.

С.Н. Махоткин

М.П.

Исполнительная схема. План-схема дворовой территории жилого дома №3, №25 ул.Ленина, жилого дома №14 ул.Душкиса в пгт.Хотынец Хотынецкого района Орловской области

ул.Ленина д.№3

Ведомость объемов:

Разработка грунта (t=30см, S=51м2, V=15,3м3)
Песок (t=20см, S=51м2, V=10,2м3)
Щебень (испр.проф.) (S=135м2, V=5,633м3)
Щебень (t=15см, S=186м2, V=37,94м3)
Битумная эмульсия (S=186м2, m=0,1533м)
Асфальтобетон В-II (t=5см, S=186м2, m=22,47м)
Скатня БС-4-2шт.
Урны метал. опрокид.-2шт.
Светильник с лампой-2копм.
Щебень (укр.обочин) (S=18,5м2, V=2,331м3)

Камень бетонный бортовой

Скамейка уличная

Урна для мусора

Светильник пылевлаго-
защищенный

(установка над входом в подъезд)



ПОДРЯДЧИК
ЗАКАЗЧИК

ул.Ленина д.№25

Ведомость объемов:

Резервотка зрешта ($t=30\text{cm}$, $S=94\text{m}^2$, $V=28.2\text{m}^3$)

Пелюк ($t=20^{\circ}\text{C}$, $S=94\text{ м}^2$, $V=20.68\text{ м}^3$)

ПЕЛОУ (I=20CM, S=341Z, V=20.60M3)
ШЕДЕНЬ (I=20CM, S=341Z, V=20.60M3)

ЩЕДЕНЬ (с. пр. проф. АЗ=ZZOMZ, V=13.00)
ШШШШШШ (t=15cm S=314m? V=64.06m3)

Щедрень (t=15cm, S=314м², V=84.06м³)
Разбока оск оск то (t=5cm S=12м² V=0.6м³)

Разборка асф. покр. тр. ($r=5\text{ см}$, $S=12\text{ МЗ}$, $V=0.6\text{ МЗ}$)

регулирующие высь или высоту. Кольца делаются из

бу́мная эму́льсия ($S=326\text{Мг}$, $\Pi=0.268\text{III}$)
 асфальтодобочный (I-5см $S=326\text{Мг}$ $\Pi=39.379\text{м}$)

Асфальтовый В-II ($\Gamma \equiv 50\text{М}$, $\Sigma = 326\text{МЗ}$, $\Pi = 33.57\text{МЗ}$)

Камни дортовые ВР
Скамья БС / Зин

Скамья ВС-4-эшт.

Урны метал. опр. — 2 шт.

Светильник с лампой-эконом.

Камень бетонный бортовой

Скамейка уличная

Урна для мусора

Светильник пылевлаго-
защитенный

(установка над входом в подъезд)

ПОДРЯДЧИК:

ЗАКАЗЧИК:

Маховкин С.Н. Генеральный директор ЗАО "Хвастовичская ПМК-9"

Мирзоев Г.И. Начальник отдела поселковой работы администрации района

ул. Школьная д. №4

7-М
мор. полж
Многоквартирный

Ведомость объемов:

Щебень (испр. проф.) ($S=38\text{ м}^2$, $V=25,34\text{ м}^3$)
Щебень ($t=8\text{ м}$, $S=38\text{ м}^2$, $V=38,4\text{ м}^3$)
Битумная эмульсия ($S=46\text{ м}^2$, $m=0,3799\text{ м}$)
Регулировочные высоты, полож. колодезев-4шт.
Асфальтобетон В-III ($t=5\text{ см}$, $S=46\text{ м}^2$, $m=55,69\text{ м}$)
Камни дорожные БФ80.30.15 ($L=48\text{ м}$)
Скамья БС-4-2шт.
Урны металл. отпруд.-2шт.
Светильник с лампой-2комп.
Щебень (укр. дорожн.) ($S=32\text{ м}^2$, $V=4,032\text{ м}^3$)

Ведомость объемов (доп. частка):

Щебень ($t=10\text{см}$, $S=40\text{м}^2$, $V=5.04\text{м}^3$)
Щебень ($t=7\text{см}$, $S=15\text{м}^2$, $V=1.32\text{м}^3$)
Битумная эмульсия ($S=40+15=55\text{м}^2$,
Асфальтобетон В-II ($t=5\text{см}$, $S=15\text{м}^2$,

Камень бетонный бортовой

Скамейка уличная

УРНА ДАЯ МУСОБА

Светильник пылевлаго-
защитный

(установка над входом в подъезд)



Махоткин С. Н. Генеральный директор ЗАО "Хвостовичская ПМК-9"

Мирзоев Г.И. Начальник отдела поселковой работы администрации района

Исполнительная схема. У-схема

Приложение №2 к форме А-1
к Акту приемочной комиссии

устройство дворовой территории жилого дома №3, №25, Ленин, жилого дома №4, №13 ул.Школьная,
жилого дома №14 ул.Пушкина в пгт.Хотынец Хотынецкого района Орловской области"

ул.Школьная д.№13

ул. Школьная

Многоквартирный
жилой дом
№13

Ведомость объемов:

Битумная эмульсия (S=637м2, m=0.5249т)
Асфальтобетон В-II (t=5см, S=637м2, m=76.95т)
Каннн бортовые БР80.30.15 (L=117м)
Скамья БС-4-3шт.
Урны метал. опрокид.-3шт.
Светильник с лампой-Экопол.
Шедень (укр.обочин)(S=58м2, V=7.308м3)

Ведомость объемов (доп.участка):

Ремонт Асфальтобетон.покр. В-II (t=8см, S=6.5м2, m=1237т)
Битумная эмульсия (S=28.8м2, m=0.0237т)
Асфальтобетон В-II (t=5см, S=28.8м2, m=3.479т)

Камень бетонный бортовой

Скамейка уличная

Урна для мусора

Светильник пылеулаго-
защитенный

(установка над входом в подъезд)



подрядчик
заказчик

Михайлов С.Н. Генеральный директор ЗАО "Хвастовичская ПМК-9"
Миронов Е.И. Начальник отдела поселковой работи администрации района


Исполнительная схема. Проектная
"Благоустройство дворовой территории жилого дома №3, №25
жилого дома №14 ул.Пушкина в пгт.Хотынец Хотынецкого района Орловской области"

ул.Пушкина д.№14

-  Камень бетонный бортовой
-  Скамейка уличная
-  Урна для мусора
-  Светильник пылевлаго-
защитный
(установка над входом в подъезд)

Ведомость объемов:

Разработка грунта (t=30см, S=130м², V=39м³)
Песок (t=20см, S=130м², V=28.6м³)
Щебень (цспр проф.) (S=330.3м², V=19.608м³)
Щебень (t=15см, S=460.3м², V=69.095м³)
Разборка асфальта (t=5см, S=11м², V=0.55м³)
Регулирование высотн. полож. колодезь-2шт.
Битумная эмульсия (S=471.3м², m=0.3884т)
Асфальтобетон В-II (t=5см, S=471.3м², m=56.94т)
Скамья БС-4-2шт.
Урны метал. опр. -2шт.
Светильник с лампой-2копм.
Щебень (укр обочин) (S=22м², V=2.772м³)

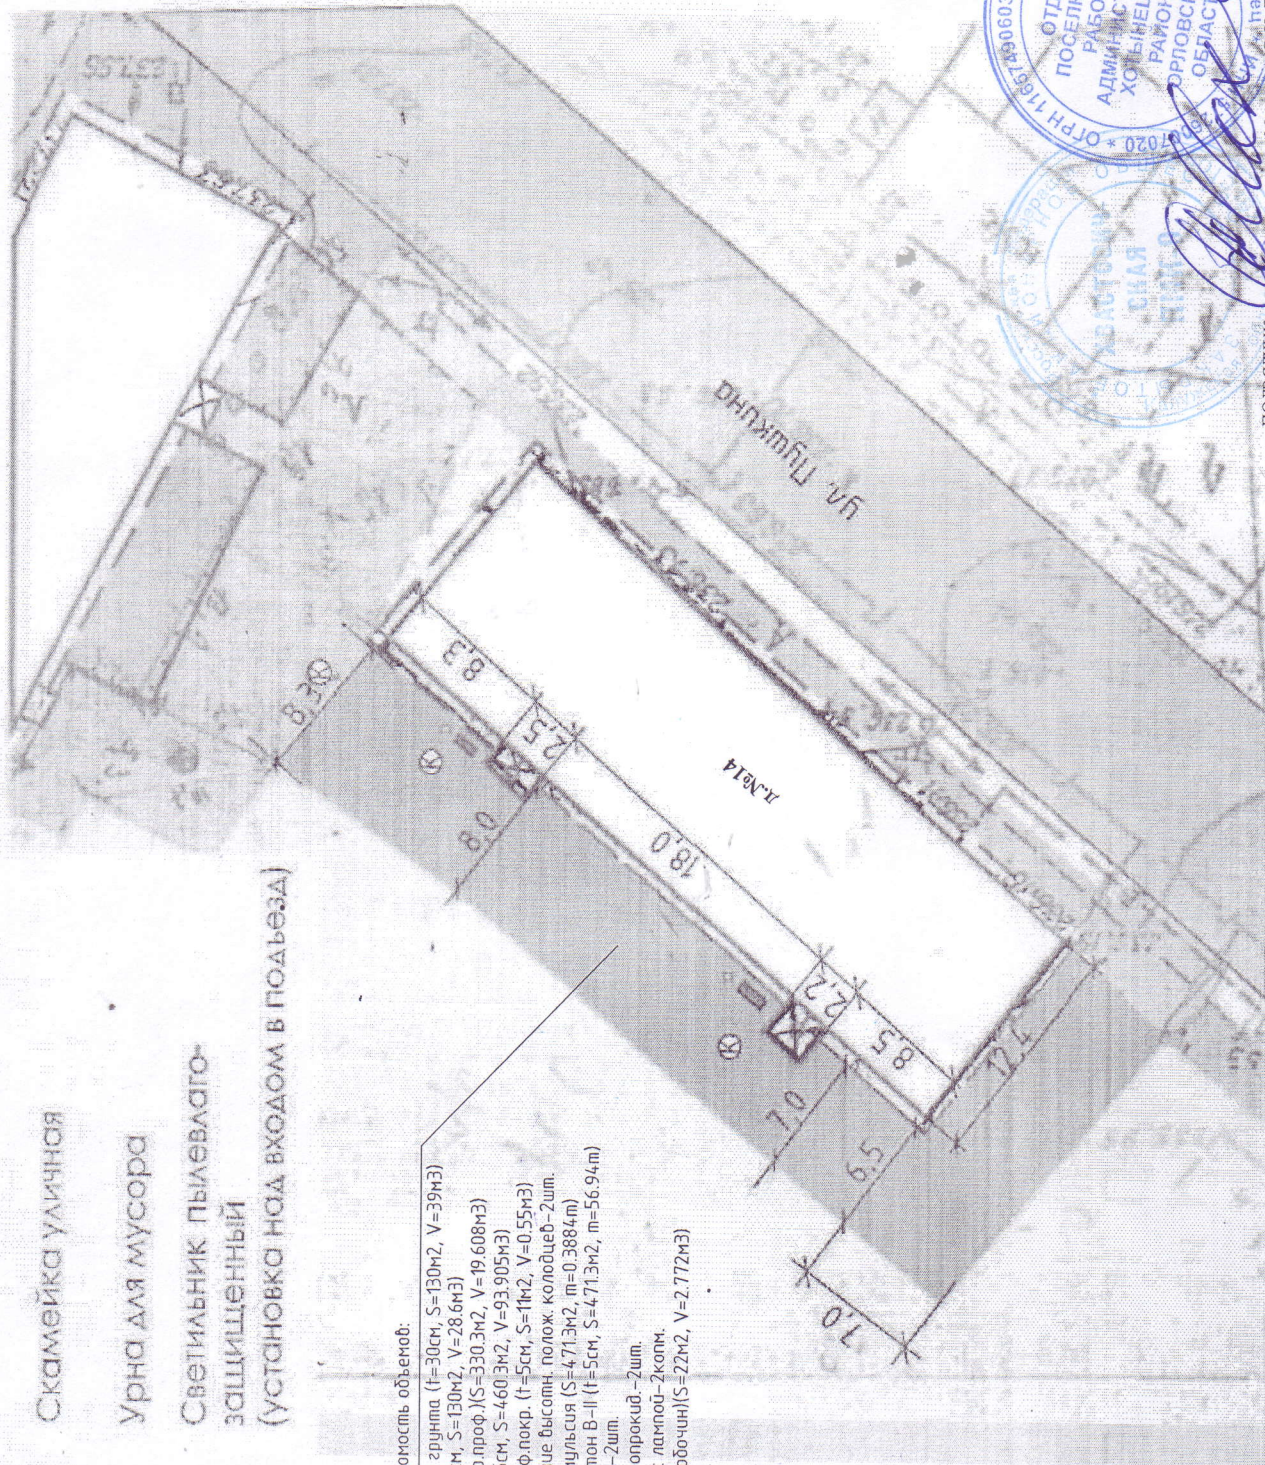

ПОДРЯДЧИК: Мирзоев Г.И. Начальник отдела поселковой работы администрации района
ЗАКАЗЧИК: Махоткин С.Н. Генеральный директор ЗАО "Хвостовичская ПМК-9"

Ведомость промеров толщины, поперечных уклонов, ширины и ровности покрытий

Наименование объекта и адрес участка: «Благоустройство дворовой территории жилого дома №3, №25 ул.Ленина, жилого дома №4, №13 ул.Школьная, жилого дома №14 ул.Пушкина в пгт.Хотынец Хотынецкого района Орловской области»

Места измерений		Тип покрытий	Поперечные уклоны, %				Ширина проезжей части, м		Толщина покрытий, см				Количество промеров под 3-метровой рейкой в продольном направлении, шт.				Отметка по оси (только для замыкающих слоев)		Коэффициент уплотнения	
			проектные	фактические	право	лево	проектная	фактическая	нижний слой	верхний слой	проектная	фактическая	до 5 мм	до 10 мм	до 15 мм	до 16 мм	проектная	фактическая	проектный	фактический
К	ПК	+			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	2	3	4																	
ул. Ленина д.3 - 186м2																				
			Песок																	
			Щебень							20	20								0,98	0,98
			Асфальт							Испр. пр.	Испр. пр.	15	15						0,98	0,98
ул.Ленина д.25 - 326м2																				
			Песок							20	20									
			Щебень							Испр. пр.	Испр. пр.	15	15						0,98	0,98
			Асфальт							Испр. пр.	Испр. пр.	5	5						0,98	0,98
ул. Школьная д.4 - 461м2+доп.15м2=476м2																				
			Щебень доп.																	
			Щебень							Испр. пр.	Испр. пр.	10/7	10/7						0,98	0,98
			Асфальт							Испр. пр.	Испр. пр.	8	8						0,98	0,98
ул.Школьная д.13 - 637м2+доп.28,8м2=665,8м2																				
			Асфальт							Испр. пр.	Испр. пр.	5	5						0,98	0,98
ул. Пушкина д.14 - 471,3м2																				
			Песок							20	20								0,98	0,98
			Щебень							Испр. пр.	Испр. пр.	15	15						0,98	0,98
			Асфальт							Испр. пр.	Испр. пр.	5	5						0,98	0,98

ПОДПИСИ:

И.

ПОДПИСИ:

ПОДПИСИ:

ЗАКАЗЧИК



Генеральный директор ЗАО «Хвостовичская ПМК-9»

Начальник отдела поселковой работы администрации района

Опись документов

принятых на хранение Отделом поселковой работы администрации Хотынецкого района Орловской области по объекту: «Благоустройство дворовой территории жилого дома №3, №25 ул.Ленина, жилого дома №4, №13 ул.Школьная, жилого дома №14 ул.Пушкина в пгт.Хотынец Хотынецкого района Орловской области»

№ п/п	Наименование документа	Количество экземпляров
1	Журнал производства работ	1 экз
2	Исполнительная документация (акты на скрытые работы)	2 экз
3	Документы лабораторий, паспорта и сертификаты качества на материалы	
5	Акт приемки законченного комплекса работ	4 экз
6	Гарантийный паспорт	4 экз
7	Фотографии объекта ремонта	1 экз

Сдал:

Генеральный директор
ЗАО «Хвастовичская ПМК-9»

Махоткин С.Н.

Принял:

Начальник отдела архитектуры, строительства и
ЖКХ администрации Хотынецкого района

Мирзоев Г.И.

Председатель комиссии:

Чадаев Ю.Ю.
Мирзоев Г.И.
Мазнина О.В.

Члены комиссии:

Костриков А.В.
Ломакина Г.А.
Ашихмин А.В.
Коростелева О.М.
Котова Н.В.
Шахина Н.В.
Кузенкова Т.П.
Бурцев Ю.В.
Фомин В.Ф.
Птицын Д.В.
Кораблина Н.А.
Махоткин С.Н.
Ступин М.Н.



Председателем МКД ул. Пушкина, д. 14
ул. Ленина, д. 3
ул. Ленина, д. 25
ул. Школьная, д. 4
ул. Школьная, д. 13
Дубовая Т. К.
Сидоров А. И.
Козлова Т. Т.
Ковалева В. И.
Борисов В. И.
Курочкин В. И.
Давыдов А. О.

Гарантийный паспорт

на «Благоустройство дворовой территории жилого дома №3, №25 ул.Ленина,
жилого дома №4, №13 ул.Школьная, жилого дома №14 ул.Пушкина
в пгт.Хотынец Хотынецкого района Орловской области»

2019г.

ХАРАКТЕРИСТИКА
Введённого в эксплуатацию объекта

Категория дороги	Улично-дорожная сеть
Протяженность:	
ул. Ленина д.3	186 м2
ул.Ленина д.25	326 м2
ул. Школьная д.4	476 м2
ул.Школьная д.13	665,8 м2
ул. Пушкина д.14	471,3 м2
Вид покрытия участка	Щебень/Асфальт
МАФ (скамьи/урны/светильники)	
ул. Ленина д.3	2шт/2шт/2шт
ул.Ленина д.25	3шт/2шт/2шт
ул. Школьная д.4	2шт/2шт/2шт
ул.Школьная д.13	3шт/3шт/3шт
ул. Пушкина д.14	2шт/2шт/2шт
Бордюры БР100.30.15	
ул.Ленина д.25	50шт
ул. Школьная д.4	48шт
ул.Школьная д.13	117шт

ГАРАНТИЙНЫЕ СРОКИ

Наименование конструктива	Установленный срок гарантии, лет	Предлагаемый срок гарантии, лет
Основание дорожной одежды	-	-
Нижний слой покрытия	-	-
Верхний слой покрытия	4	4

ЗАО «Хвастовичская ПМК-9» принимает на себя обязательства устранять дефекты, возникшие в течение гарантийных сроков. В случае выявления дефектов отдельных конструктивных элементов сооружений в пределах гарантийного срока, гарантийный срок на этот элемент или часть сооружения устанавливается вновь в соответствии с Муниципальным контрактом с момента завершения работ по устранению дефекта, оформленный соответствующим актом.

Продолжительность проведения работ по устранению выявленных дефектов не засчитывается в гарантийный срок.

Подрядчик несет имущественную ответственность за качество и объемы выполненных работ, сроки, оговоренные в Муниципальном контракте и настоящем Гарантийным паспортом.

Генеральный директор
ЗАО «Хвастовичская ПМК-9»

/С. Н. Махоткин/

Гарантийный паспорт выдан: Отделу поселковой работы администрации Хотынецкого района Орловской области
Юр.адрес: 303930 Орловская область, пгт. Хотынец, ул. Ленина, 33 ИНН 5726007020 к Муниципальному контракту №08546000001190000030001 от 11.04.2019г.

Которое обязуется своевременно и в полном объеме производить работы по содержанию принятых в эксплуатацию дворовых территорий по объекту: «Благоустройство дворовой территории жилого дома №3, №25 ул.Ленина, жилого дома №4, №13 ул.Школьная, жилого дома №14 ул.Пушкина в пгт.Хотынец Хотынецкого района Орловской области» а также зданий и сооружений дорожно-эксплуатационной службы.

Начальник отдела поселковой работы
администрации Хотынецкого района

/Г.И. Мирзоев/
